

社会資本総合整備計画

平成29年3月29日

| 計画の名称 | 横瀬町における下水道の普及促進 | | | | | | | | | | 重点配分対象の該当 | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|---|----------------|----------------|--------|-----|----------|------|---------|----------------|----------------------|-----------------------------|--------------------------------------|----------------|-----|-----|-----|------------------|----------------|----------------|----|-------|-------|-------|--|
| 計画の期間 | 平成25年度 ~ 平成29年度 | | | | | 交付対象 | 横瀬町 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計画の目標 | 下水道を整備することにより、快適な生活環境を作るとともに、安全安心な町民生活を確保する。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計画の成果目標（定量的指標） | ①下水道処理人口普及率を30.2%（H25）から36.5%（H29）に増加させる。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定量的指標の定義及び算定式 | <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">①下水道処理人口普及率 下水道を利用できる人口（人）／総人口（人）</th> <th colspan="3">定量的指標の現況値及び目標値</th> <th rowspan="2">備考</th> </tr> <tr> <th>当初現況値 (H25当初)</th> <th>中間目標値 (H 末)</th> <th>最終目標値 (H 末)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>30.2%</td> <td>34.3%</td> <td>36.5%</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | | | | | | ①下水道処理人口普及率 下水道を利用できる人口（人）／総人口（人） | 定量的指標の現況値及び目標値 | | | 備考 | 当初現況値 (H25当初) | 中間目標値 (H 末) | 最終目標値 (H 末) | | 30.2% | 34.3% | 36.5% | |
| ①下水道処理人口普及率 下水道を利用できる人口（人）／総人口（人） | 定量的指標の現況値及び目標値 | | | 備考 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 当初現況値 (H25当初) | 中間目標値 (H 末) | 最終目標値 (H 末) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 30.2% | 34.3% | 36.5% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 全体事業費 | 合計 (A+B+C+D) | 342百万円 | A | 285百万円 | B | 0百万円 | C | 57百万円 | D | 0百万円 | 効果促進事業費の割合 C / (A+B+C+D) | 16.6% | | | | | | | | | | | | |
| 交付対象事業 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A 基幹事業 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 番号 | 事業種別 | 地域種別 | 交付対象 | 直接間接 | 事業者 | 事業及び施設種別 | 省略工種 | 国費率(基本) | 要素となる事業名 | 事業内容 | 市町村名 | 事業実施期間(年度) | | | | | 全体事業費(百万円) | 費用便益比 | 個別施設計画策定状況 | 備考 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | H25 | H26 | H27 | H28 | H29 | | | | | | | | |
| 横瀬処理区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AI-1-1 | 下水道 | 一般 | 横瀬町 | 直接 | 横瀬町 | 汚水 | 設置 | 1/2 | 横瀬処理区汚水管渠整備事業 | 管渠L=3,663m、舗装復旧、詳細設計 | 横瀬町 | | | | | | 285.0 | | - | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 合計 | 285 | | | | | | | | | | | |
| B 関連社会資本整備事業 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 番号 | 事業種別 | 地域種別 | 交付対象 | 直接間接 | 事業者 | 事業及び施設種別 | 省略工種 | 国費率(基本) | 要素となる事業名 | 事業内容 | 市町村名 | 事業実施期間(年度) | | | | | 全体事業費(百万円) | 費用便益比 | 個別施設計画策定状況 | 備考 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | H25 | H26 | H27 | H28 | H29 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 合計 | | | | | | | | | | | | |
| C 効果促進事業 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 番号 | 事業種別 | 地域種別 | 交付対象 | 直接間接 | 事業者 | 事業及び施設種別 | 省略工種 | 国費率(基本) | 要素となる事業名 | 事業内容 | 市町村名 | 事業実施期間(年度) | | | | | 全体事業費(百万円) | 備考 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | H25 | H26 | H27 | H28 | H29 | | | | | | | | |
| CI-1-1 | 下水道 | 一般 | 横瀬町 | 直接 | 横瀬町 | 汚水 | 設置 | 1/2 | 単独管整備事業 | 管渠L=916m、舗装復旧、詳細設計 | 横瀬町 | | | | | | 52.3 | | | | | | | |
| CI-1-2 | 下水道 | 一般 | 横瀬町 | 直接 | 横瀬町 | 汚水 | 設置 | 1/2 | 排水設備設置費助成事業 | 町助成の一部を助成 | 横瀬町 | | | | | | 4.5 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 合計 | 57 | | | | | | | | | | | |
| 番号 | 一体的に実施することにより期待される効果 | | | | | | | | | | | 備考 | | | | | | | | | | | | |
| D 社会資本整備円筒化地籍整備事業 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 番号 | 事業種別 | 地域種別 | 交付対象 | 直接間接 | 事業者 | 事業及び施設種別 | 省略工種 | 国費率(基本) | 要素となる事業名(事業箇所) | 事業内容(面積等) | 市町村名 | 事業実施期間(年度) | | | | | 全体事業費(百万円) | 備考 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | H25 | H26 | H27 | H28 | H29 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 合計 | | | | | | | | | | | | |
| 番号 | 一体的に実施することにより期待される効果 | | | | | | | | | | | 備考 | | | | | | | | | | | | |

交付金の執行状況

(単位:百万円)

| | H25 | H26 | H27 | H | H |
|--------------------------------|-----------------------------------|------|------|---|---|
| 配分額 (a) | 42 | 27 | 31 | | |
| 計画別流用 増△減額 (b) | 42 | 27 | 31 | | |
| 交付額 (c=a+b) | 42 | 27 | 31 | | |
| 前年度からの繰越額 (d) | 0 | 26 | 0 | | |
| 支払済額 (e) | 17 | 53 | 31 | | |
| 翌年度繰越額 (f) | 25 | 0 | 0 | | |
| うち未契約繰越額 (g) | 24 | 0 | 0 | | |
| 不用額 (h = c+d-e-f) | 0 | 0 | 0 | | |
| 未契約繰越+不用率 (h = (g+h)/(c+d)) | 57.1% | 0.0% | 0.0% | | |
| 未契約繰越+不用率が10%を超えている 場合その理由 | 平成25年度補 正予算分を未 契約繰越した ため | | | | |

※ 平成26年度以降の各年度の決算額を記載。


(参考図面) 社会資本総合整備計画

| | | | | |
|-------|-----------------------|--|------|-----|
| 計画の名称 | 横瀬町における下水道の普及促進 | | 交付対象 | 横瀬町 |
| 計画の期間 | 平成25年度 ~ 平成29年度 (5年間) | | | |

横瀬処理区計画図

C1-1-1
単独管整備事業
C1-1-2
排水設備設置費助成事業

A1-1-1
横瀬処理区污水管渠整備事業

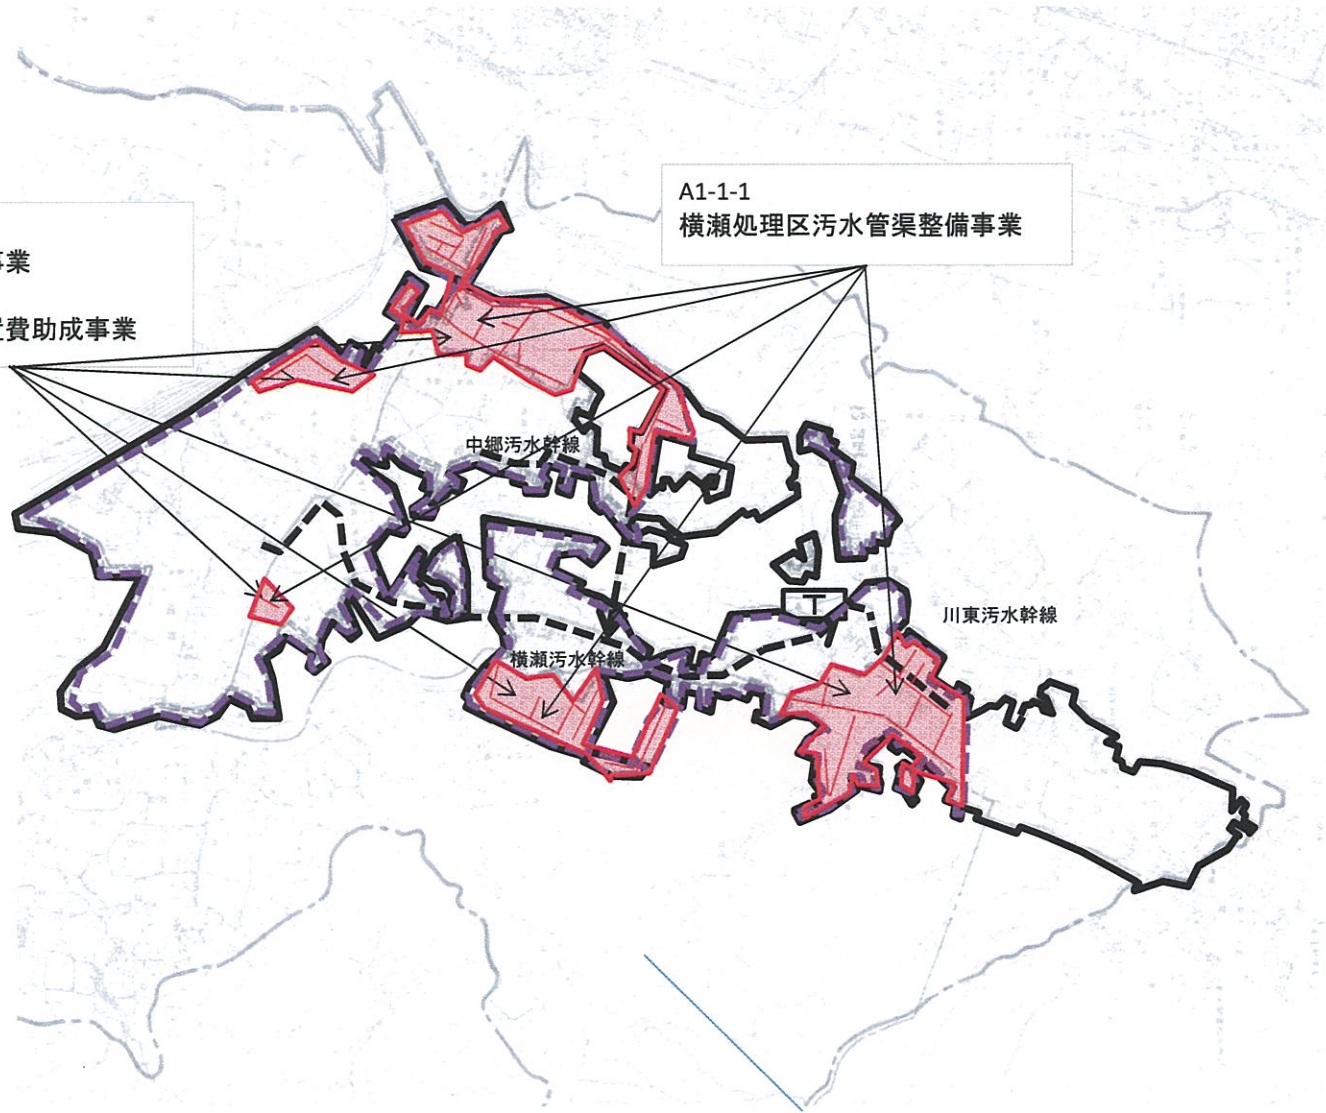

| 凡 例 | |
|-----|----------------------------|
| | 全体計画区域 |
| | 事業計画区域 |
| | 処理場 |
| | 横瀬処理区 污水管渠整備区域 (A事業) |
| | 横瀬処理区 污水管渠整備区域 (C事業) |
| | 横瀬污水幹線 中郷污水幹線 川東污水幹線 |

社会資本整備総合交付金チェックシート

事業主体名：横瀬町

計画の名称：横瀬町における下水道の普及促進

| I. 目標の妥当性 | チェック欄 |
|----------------------------|-------|
| ①計画の目標が上位計画等と適合している。 | ○ |
| ②地域の課題を踏まえた目標が設定されている。 | ○ |
| ③関連する他事業の計画と整合性が確保されている。 | ○ |
| | |
| | |
| | |
| II. 計画の効果・効率性 | |
| ①目標と指標・数値目標の整合性が確保されている。 | ○ |
| ②指標・数値目標と事業内容の整合性が確保されている。 | ○ |
| ③指標・数値目標が分かりやすいものとなっている。 | ○ |
| ④指標・数値目標の根拠が整理されている。 | ○ |
| ⑤十分な事業効果が見込まれている。 | ○ |
| ⑥効果促進事業は目標達成に資する内容である。 | ○ |
| | |
| | |
| | |
| III. 計画の実現可能性 | |
| ①全体事業費・要素事業の額が適切である。 | ○ |
| ②関連する機関との調整が図られている。 | ○ |
| ③計画の具体性など事業の熟度が高い。 | ○ |
| | |
| | |
| | |
